

地質調査計画の概要について

1. 調査の目的

新規規制基準適合性審査における敷地周辺の地質・地質構造に係る審議状況を踏まえ、地質調査を実施します。

2. 調査計画の概要

調査の項目、目的、内容及び数量は、表1及び図1のとおりです。

本調査によって得られるデータについては、これまでに得られた地質調査のデータとあわせて総合的な評価・とりまとめを行い、今後の審査会合で説明していくこととしております。

表1 調査計画の概要

項目	目的	内容*	数量*
海成段丘面・海岸微地形調査	海成段丘面、海岸微地形の地質情報等に係る補足データの取得	<ul style="list-style-type: none"> ● ボーリング調査(図2) ● 試料採取(図3) ● トレンチ調査(図4) ● 地表地質踏査 	<ul style="list-style-type: none"> ● 地表地質踏査：約10地点 ● ボーリング調査：約90本(延長約900m)
河成段丘面調査	河成段丘面の地質情報等に係る補足データの取得	<ul style="list-style-type: none"> ● 地表地質踏査 ● ボーリング調査 	<ul style="list-style-type: none"> ● 試料採取：約60箇所
背斜構造等調査	背斜構造等の地質・地質構造に係る補足データの取得	<ul style="list-style-type: none"> ● 地表地質踏査 ● ボーリング調査 	<ul style="list-style-type: none"> ● トレンチ調査：2～3箇所程度

※ 内容及び数量については、現地の状況、調査の進捗等に応じて変更することがあります。

3. 調査の時期

調査は、平成27年8月～12月を予定しています。

なお、調査の進捗等に応じて調査時期は変わる場合があります。



図2 ボーリング調査作業状況(事例)



図3 コアドリルを用いた試料採取状況(事例)

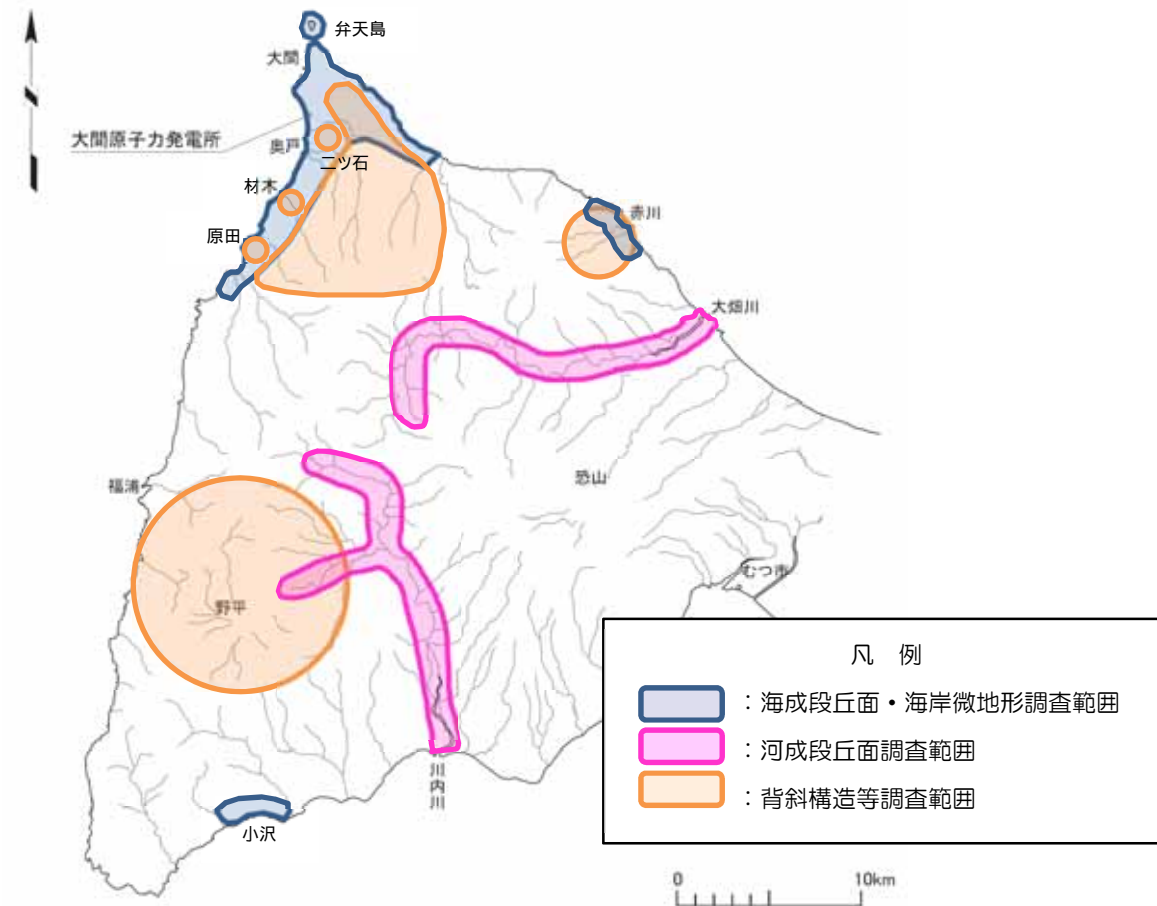


図1 地質調査範囲



図4 トレンチ調査作業状況(事例)
