



# 瀬戸石ダム 堆砂量および堆砂排除の実績

## 【瀬戸石調整池の堆砂量の経年推移】

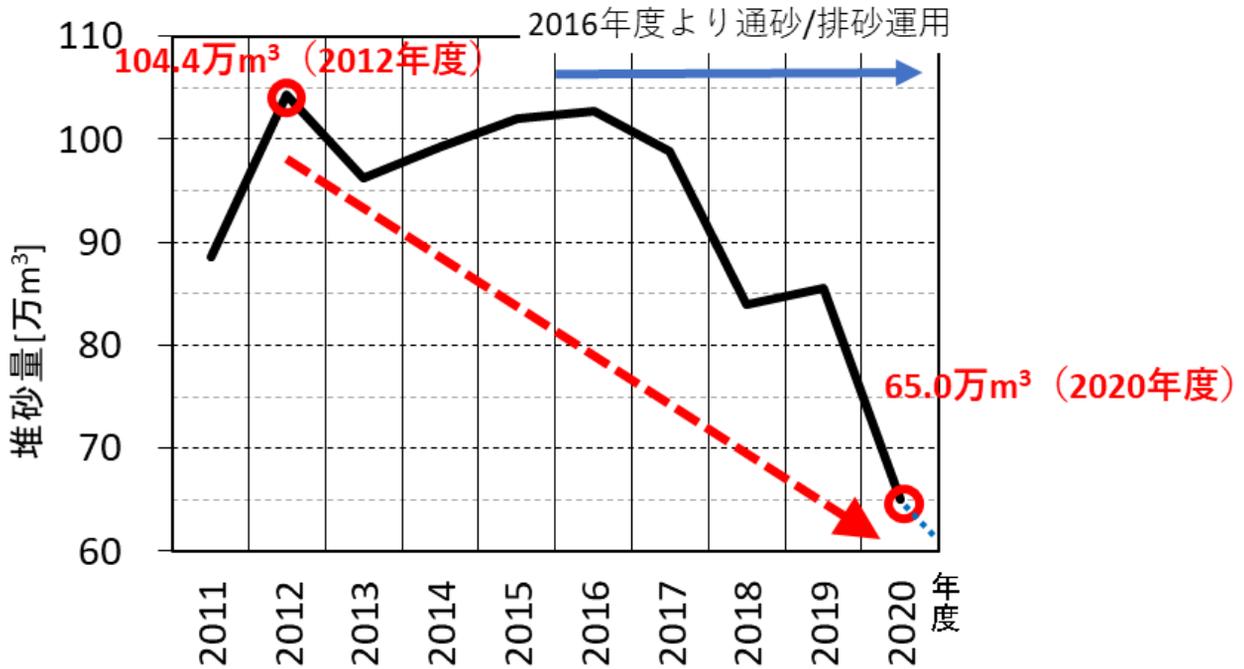

### 【2020年度の堆砂排除の実績】

- (1) 堆砂排除量 : 実績 約33,000m<sup>3</sup>  
                  計画 約25,000m<sup>3</sup>  
                  ※ 計画に対して約3割の増加
- (2) 排除期間 : 2021年1~3月

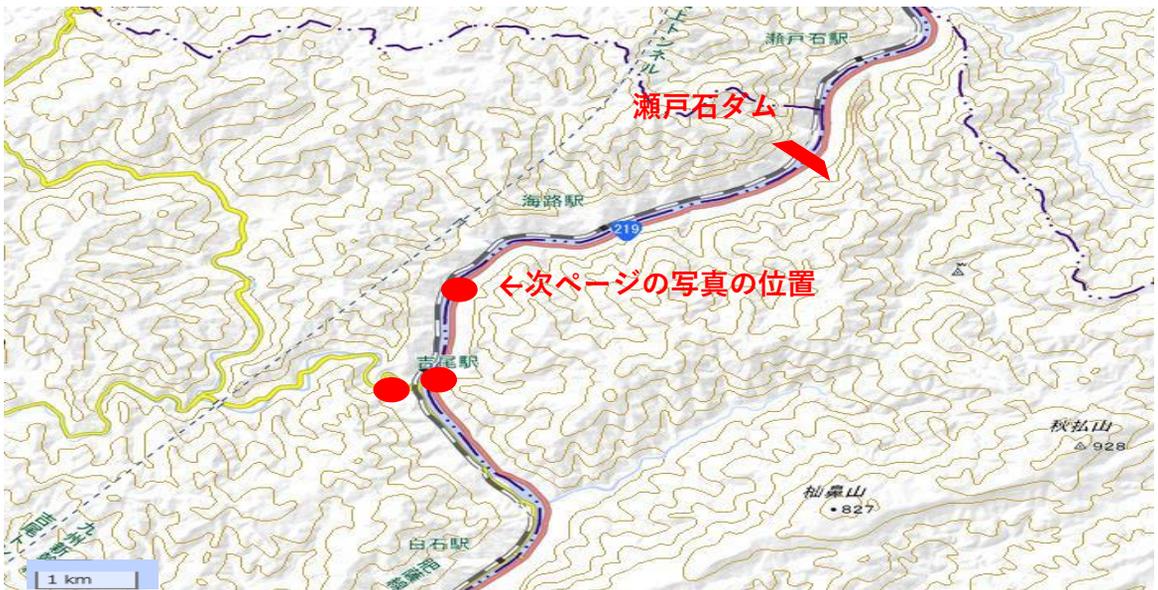

● 堆砂排除箇所

出典: 国土地理院ウェブサイト

・瀬戸石調整池の堆砂量は、計画的な堆砂排除および通砂/排砂運用により減少しています。最も多い2012年度: 104.4万m<sup>3</sup> → 2020年度は65.0万m<sup>3</sup>(約4割減少)  
・通砂/排砂運用は、出水時に調整池内に流入・堆積する土砂を、自然に下流へ還元させる取組みとして2016年度より実施しています。

【瀬戸石調整池での堆砂排除の状況】



排除前  
2021年1月



堆積土砂を湖外に搬出しました。

排除後  
2021年4月
