


瀬戸石ダム 堆積土砂排除実績

【瀬戸石調整池の堆積土砂量の経年推移】

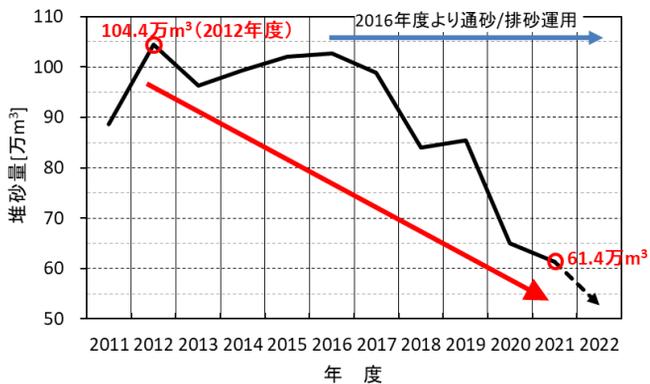

※ 61.4万m³は2021年10月の堆砂量

【2021年度の堆積土砂排除実績】

- (1) 堆積土砂排除量：約9万m³
- (2) 排除期間：2021年11月～2022年3月

【堆積土砂掘削箇所】



地理院地図(電子国土Web)に加筆

【瀬戸石調整池での堆積土砂排除の状況】

排除前(2021年11月)



掘削箇所①(球磨川本流左岸)

排除後(2022年3月)



掘削箇所①(球磨川本流左岸)



掘削箇所②(球磨川本流右岸)



掘削箇所②(球磨川本流右岸)

- ・ 瀬戸石調整池の堆積土砂量は、計画的な堆積土砂排除および通砂/排砂運用により、最も多い2012年度104.4万m³に比べ、2021年10月の調査では、61.4万m³と約4割減少しています。
- ・ 昨年度は、約9万m³の排除を実施しました。今後も、計画的に進めてまいります。
- ・ 最新の堆積土砂量は、河床の調査が終了後、お知らせします。
